

長野電鉄屋代線跡地整備事業

第四回検討委員会

令和5年2月21日

千曲市建設部都市計画課


○	今年度の取組	・ ・ ・ ・ ・	2
○	現地写真、イメージ図	・ ・ ・ ・ ・	3
○	事業計画	・ ・ ・ ・ ・	8
○	今後の予定	・ ・ ・ ・ ・	10

今年度の取組（令和4年度）

年 月	内 容	備考
令和4年7月28日	第3回長野電鉄屋代線跡地整備検討部会	
8月23日	第3回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議	
9月5日	工事契約 L=518m 工期 ~令和5年3月13日	(株)武田組
9月16日	屋代地区区長への説明会	
9月21日	屋代4区工事説明会	
9月27日	屋代5区工事説明会	
令和5年2月21日	第4回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議	

工事内容

- ・道路側溝
- ・道路擁壁
- ・防犯灯
- ・転落防護柵

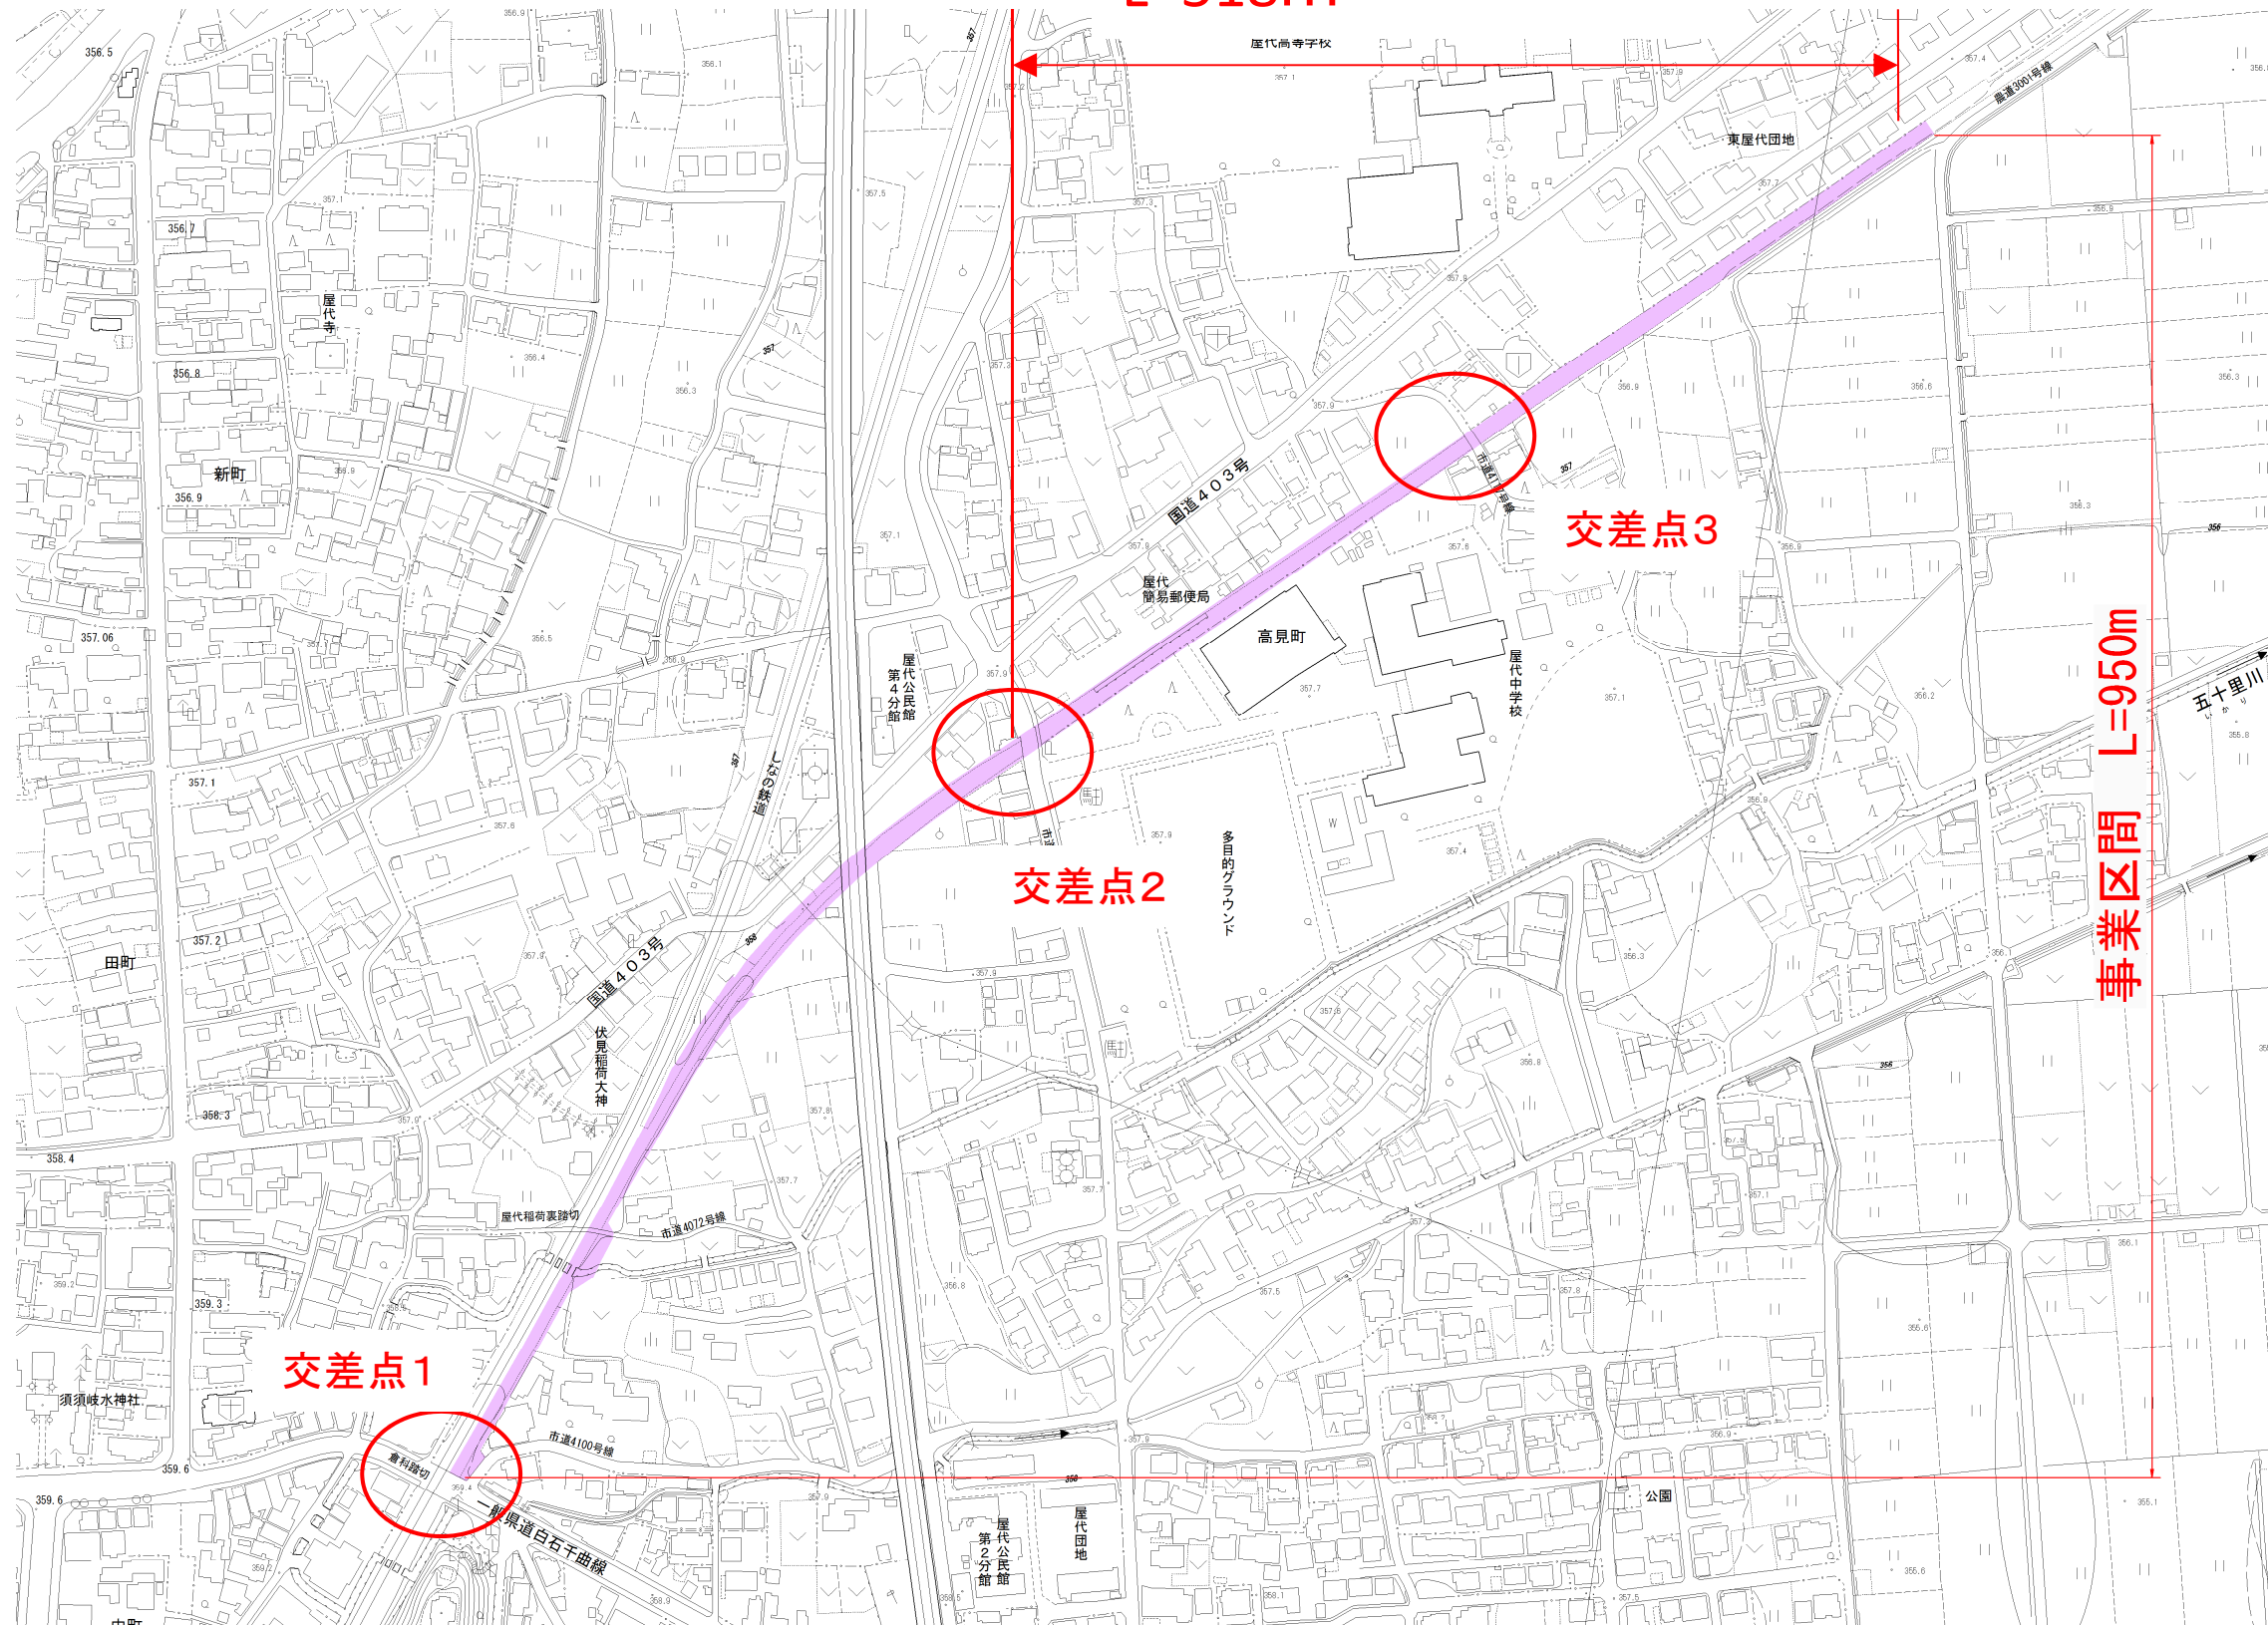

現地写真（2月17日撮影）



現地写真（2月17日撮影）

①



③



②



④



イメージ図

①

交差点注意



現地写真（2月17日撮影）

①



③



②



スロープ部 イメージ図




令和5年度事業計画


○工事発注5月頃

○工事内容

- ・舗装工
- ・目隠しフェンス
- ・その他(車止め、路面標示等)

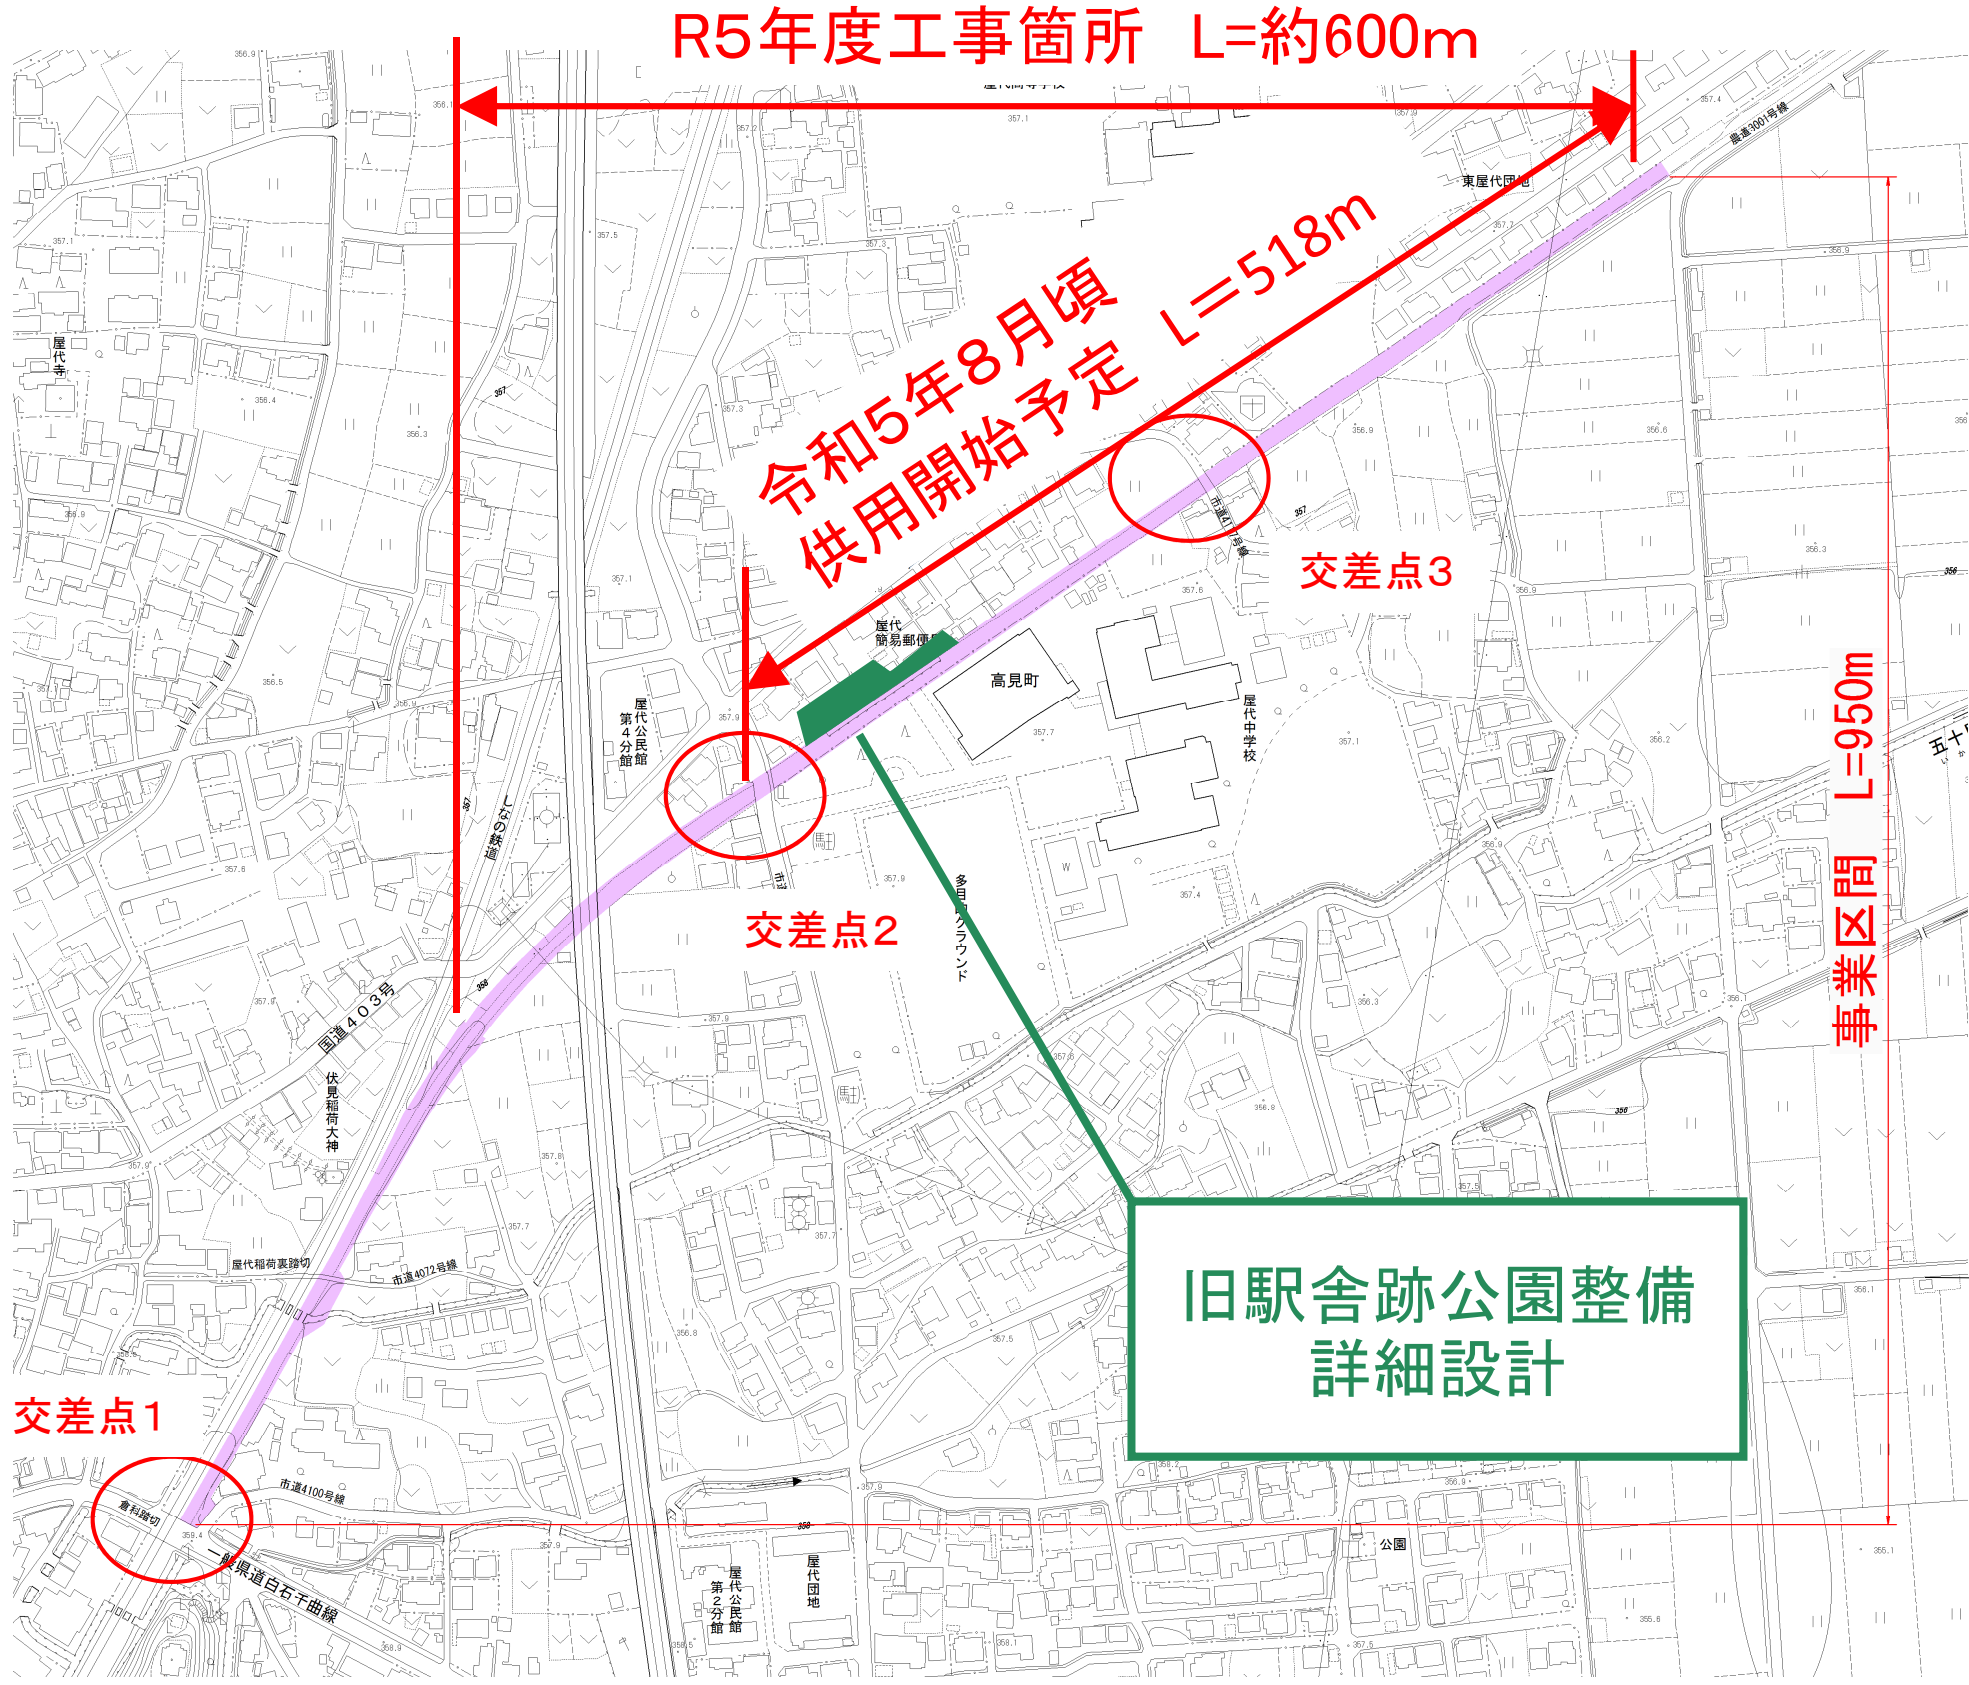

断面図

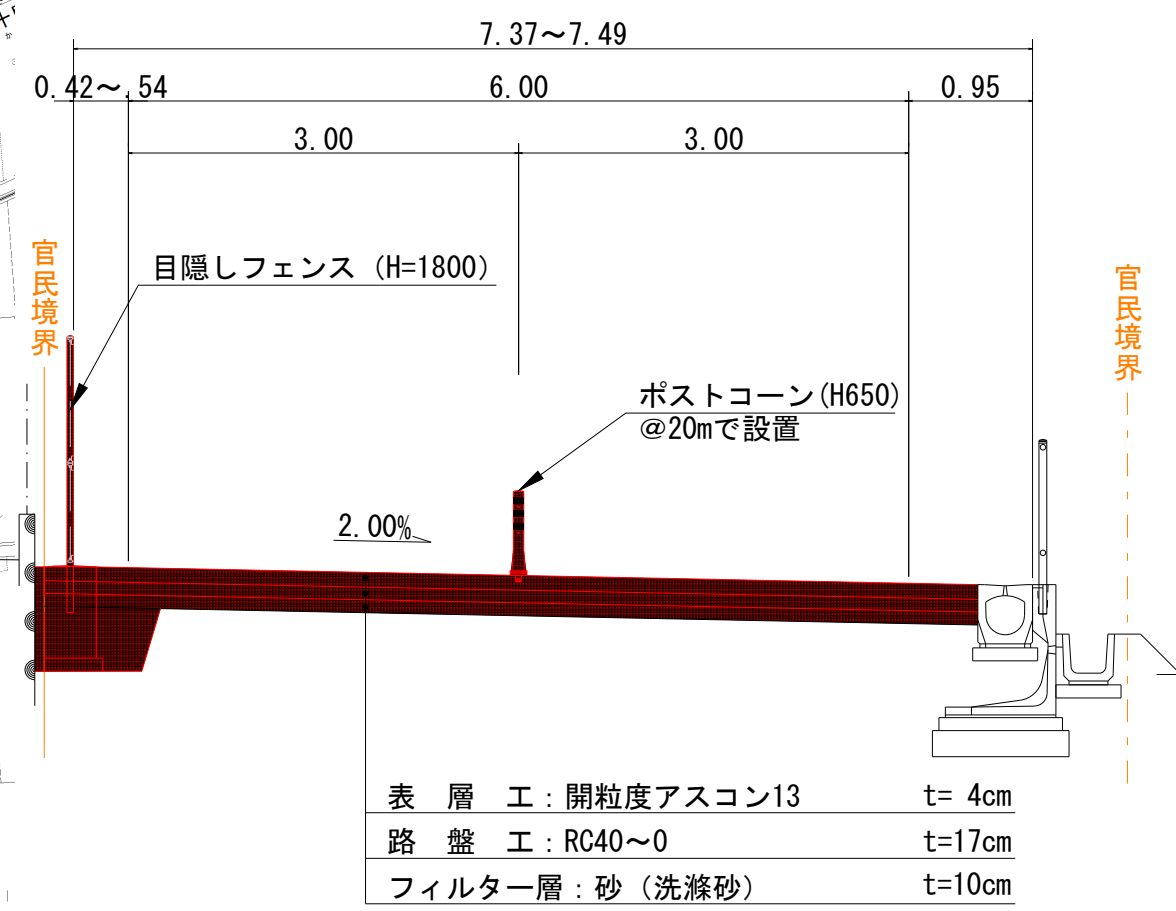

○令和4年度

令和4年度工事 令和5年3月13日竣工

○令和5年度

令和5年度工事 令和5年5月予定

令和5年度工事区間供用開始 令和5年8月予定

旧東屋代駅舎跡公園整備 詳細設計 地元協議の進捗による

旧東屋代駅舎跡公園整備 地元説明会 地元協議の進捗による

しなの鉄道並走区間の踏切遮断機設備、コンクリート柱移設(しなの鉄道)

○令和6年度

令和6年度 工事(第一期 L=950m 完成予定)

旧東屋代駅舎跡公園整備 工事



踏切遮断機設備、コンクリート柱移設

