野高場地区浸透対策その1工事

施工業者：藤森建設工業㈱　　工期：R7.9.2　～　~~R8.5.29~~ R8.7.10

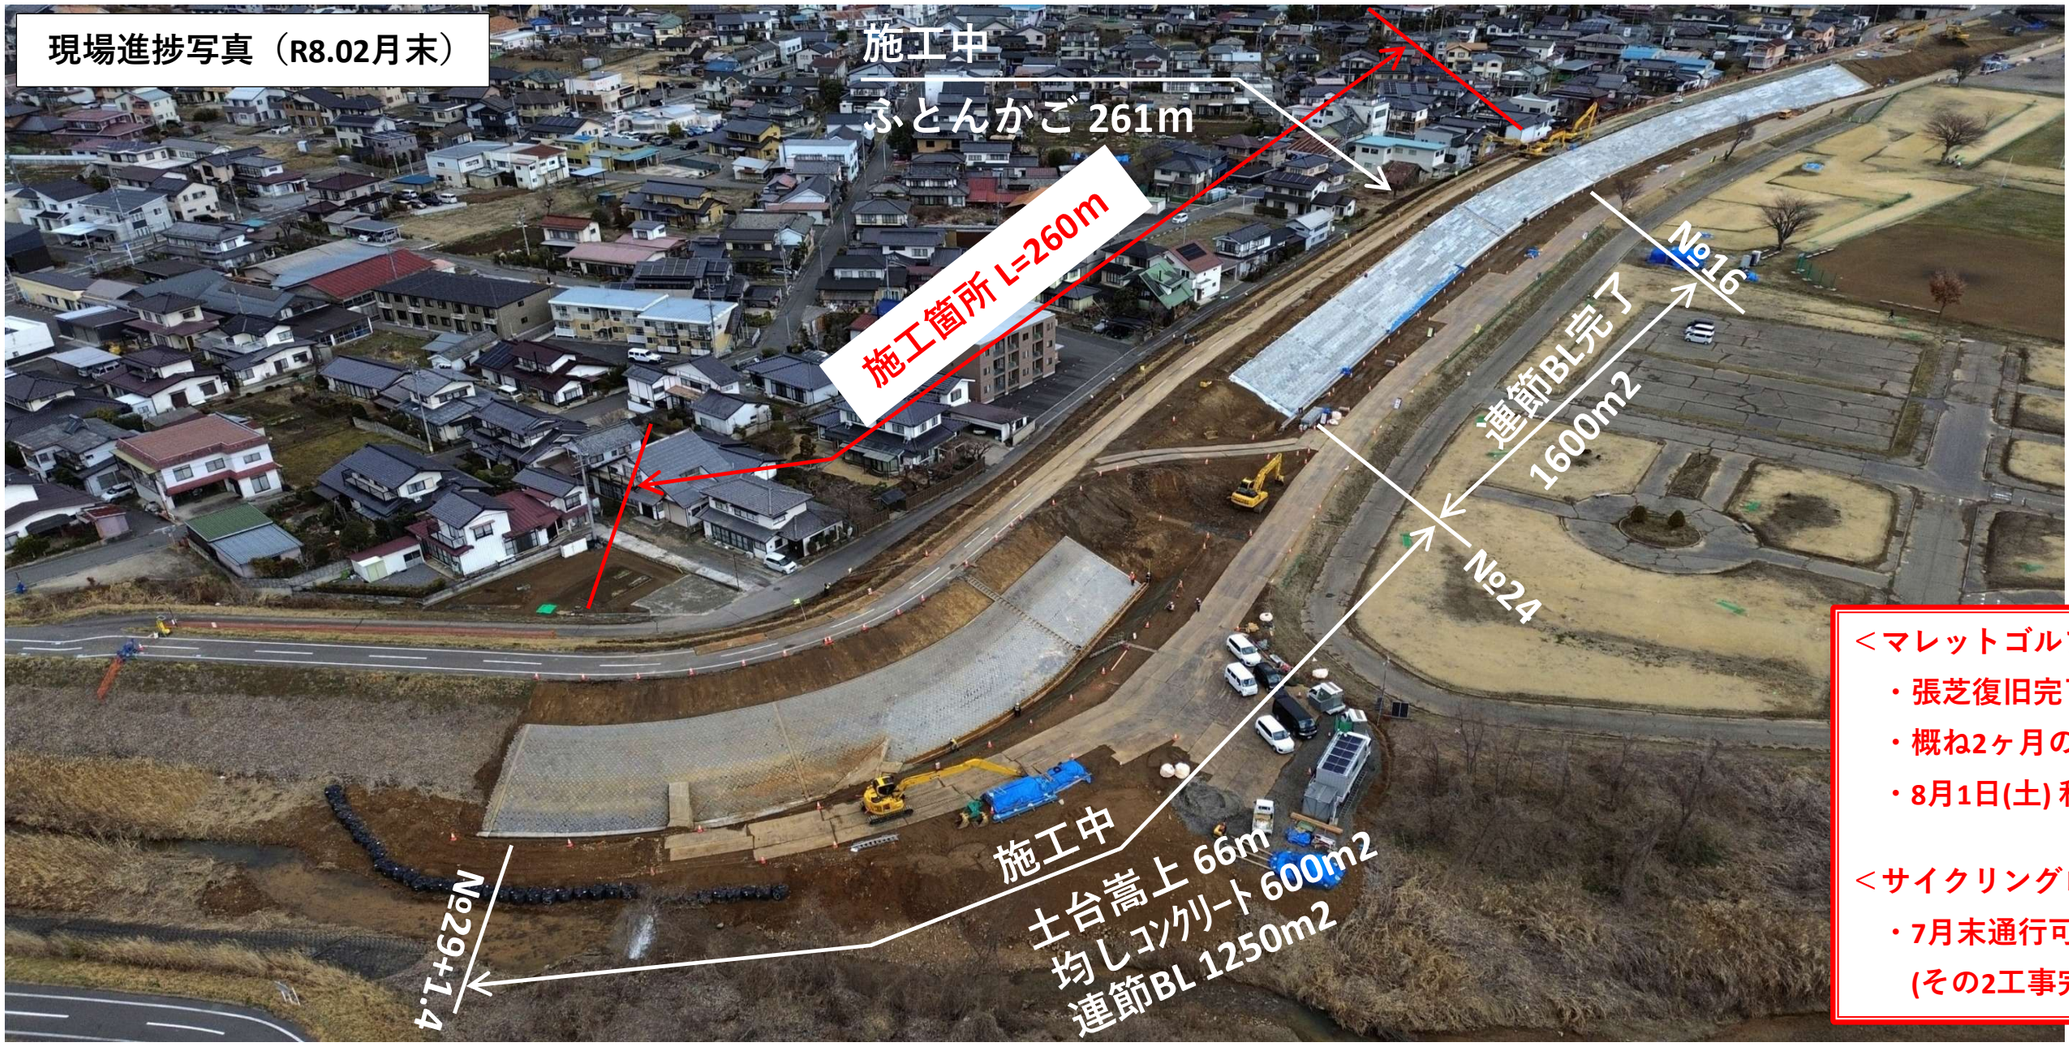

＜マレットゴルフ場＞
- 張芝復旧完了 6月初旬
- 概ね2ヶ月の養生期間が必要
- 8月1日(土) 利用再開予定

＜サイクリングロード＞
- 7月末通行可能
  (その2工事完了後)

工　程　表	R7.9月 ～ 11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	備　考
準備工	■							■	■	
河川土工		■	■	■	■	■	■			
護岸基礎工			■	■		■				L=208m
ふとんかご工					■					L=260m
法覆護岸工（大型連節ﾌﾞﾛｯｸ）				■	■	■				A=2850m2
付帯道路工（堤防天端舗装）							■	■		A=1700m2
植生工（川裏・ﾏﾚｯﾄ張芝）						■	■	■		A=4200m2
仮設工	■	■		■			■			

野高場地区浸透対策その2工事

施工業者：㈱鹿熊組　　**工期：R7.9.3　～　~~R8.5.29~~ R8.7.31**

＜マレットゴルフ場＞
- 張芝復旧完了 6月上旬
- 概ね2ヶ月の養生期間が必要
- 8月1日(土) 利用再開予定

＜サイクリングロード＞
- 7月末通行可能
  (その2工事完了後)

＜既設坂路＞
- 6月下旬頃解放予定

工　程　表	R7.9月 ～ 11月	12月	R8.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	備　考
準備工	■								■	
河川土工		■	■	■	■		■			
護岸基礎工			■	■						L=271m
ふとんかご工					■					L=296m
法覆護岸工（大型連節ﾌﾞﾛｯｸ）			■	■	■	■	■			A=3300m2
付帯道路工（堤防天端・坂路舗装）								■		A=2700m2
植生工（川裏・ﾏﾚｯﾄ張芝）						■	■	■		A=5300m2
仮設工		■	■	■	■	■	■	■	■	
