信濃川水系緊急治水対策プロジェクト進捗状況について


令和8年10月6日
部長会議資料(道路河川課)

現在の工事状況

【堤防強化(野高場地区)】
○野高場地区浸透対策工事その1工事(完了)
施工業者:藤森建設工業㈱
工期:令和7年9月2日～R8年7月31日
○野高場地区浸透対策工事その2工事(完了)
施工業者:㈱鹿熊組
工期:令和7年9月3日～R8年7月31日

【埴生遊水地】
○埴生遊水地周囲堤護岸その1工事
施工業者:㈱宮下組
工期:令和7年3月27日～
令和8年11月30日
○埴生遊水地周囲堤護岸その2工事
施工業者:川中島建設㈱
工期:令和7年3月26日～
令和8年9月30日
○埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤護岸工事
施工業者:川中島建設㈱
工期:令和7年10月17日～
令和8年11月30日
○埴生遊水地周囲堤その3他工事
令和8年10月契約予定
○埴生遊水地周囲堤その4及び越流堤工事
令和8年10月契約予定

【平和橋遊水地】
○平和橋遊水地周囲堤その1他工事
令和8年10月契約予定
○平和橋遊水地排水樋門及び周囲堤工事
令和8年10月契約予定

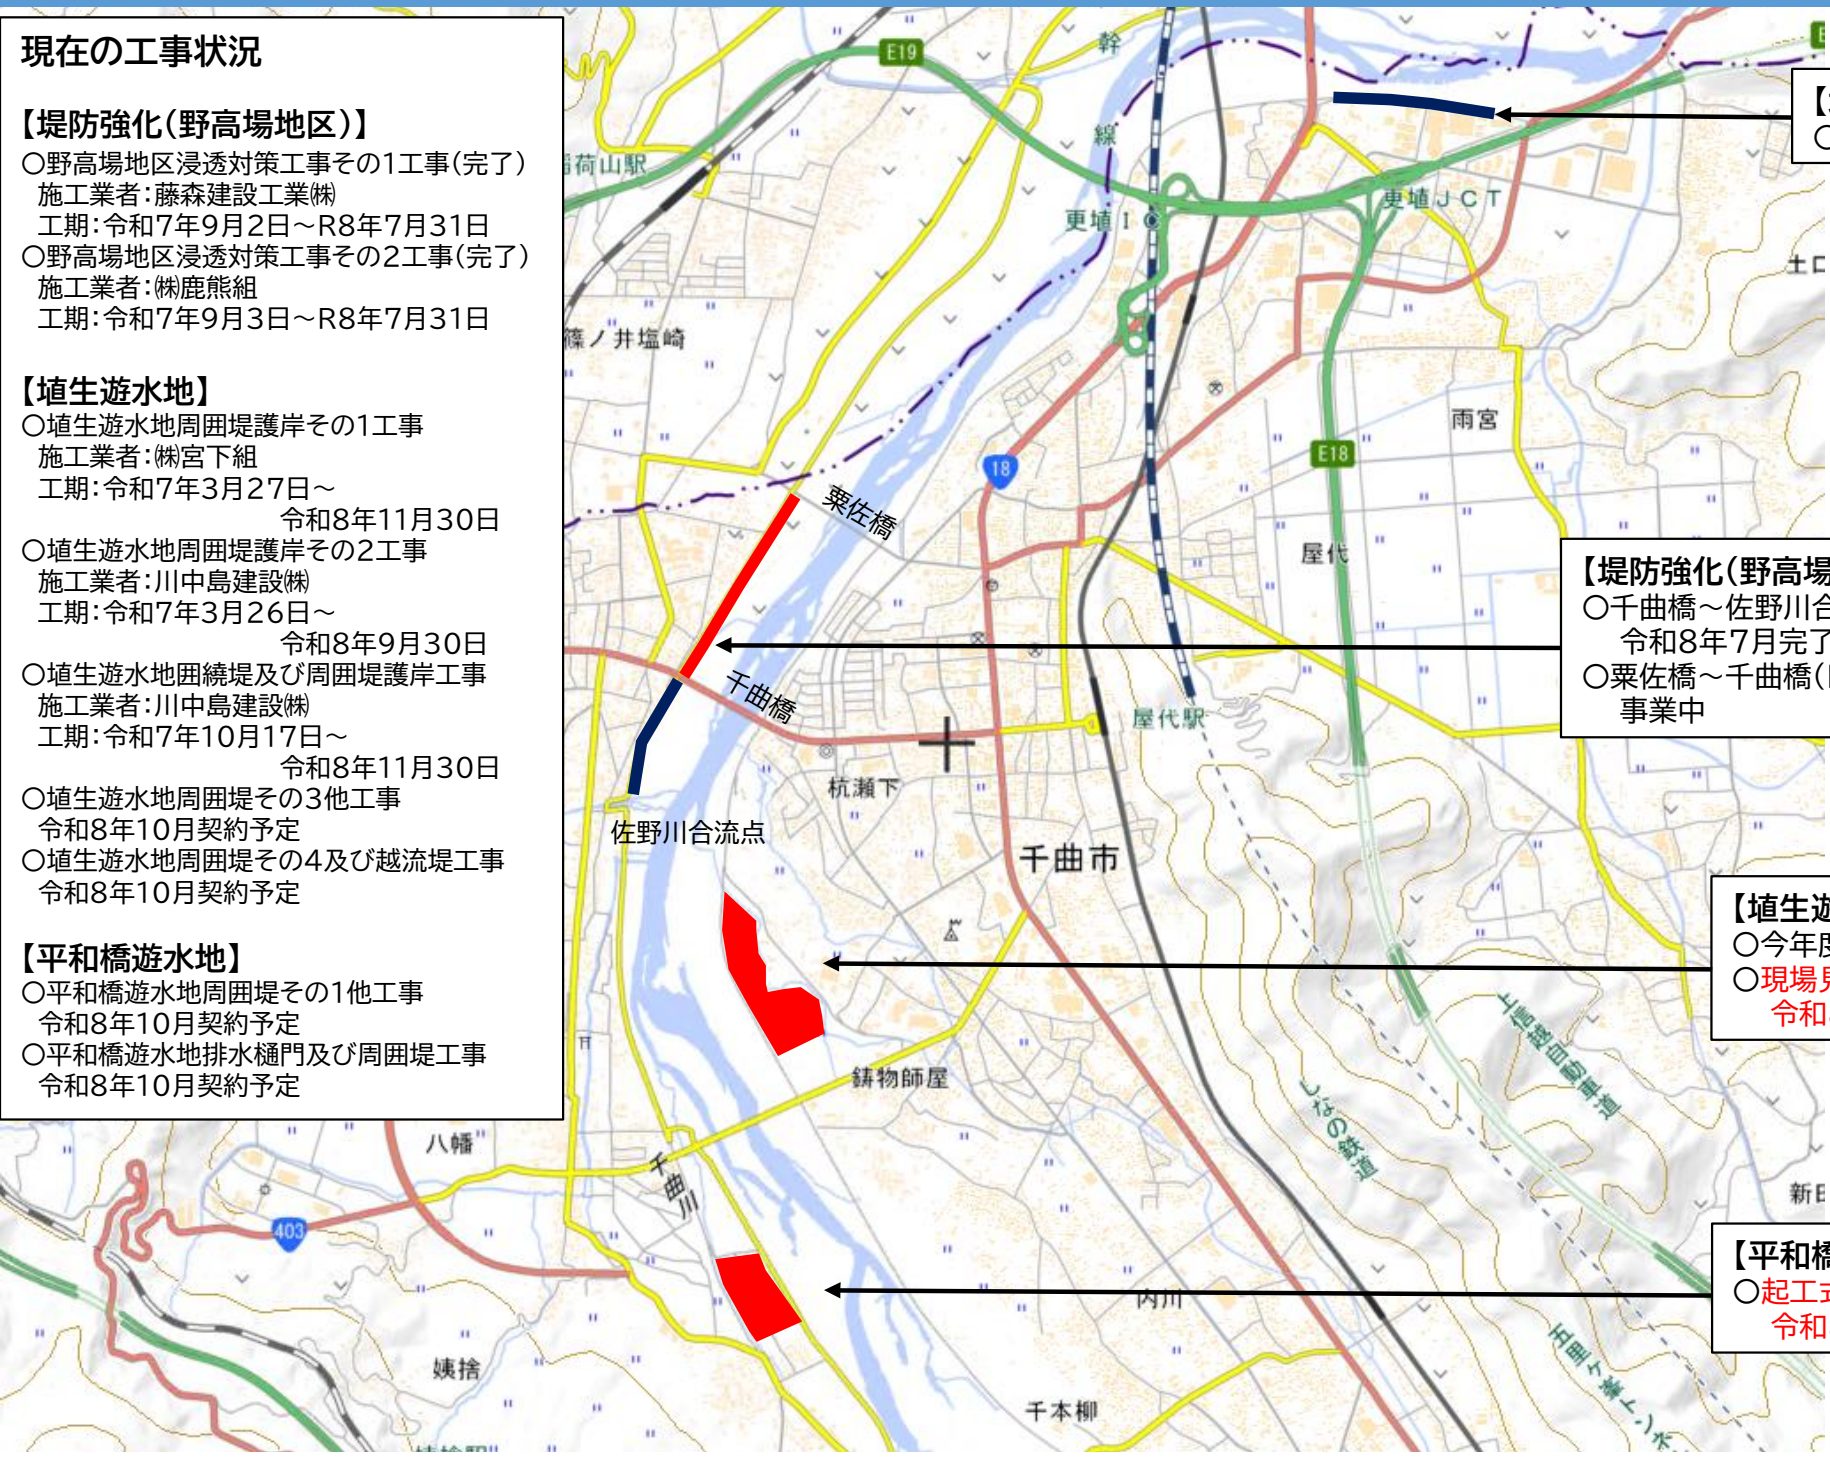

【堤防強化(雨宮地区)】
○令和8年3月完了

【堤防強化(野高場地区)】 全体計画
○千曲橋～佐野川合流地点(L=約560m)
令和8年7月完了
○粟佐橋～千曲橋(L=約830m)
事業中

【埴生遊水地】
○今年度末完了を目標
○現場見学会
令和8年11月28日(土)9:00～

【平和橋遊水地】
○起工式
令和8年11月14日(土)10:30～

事業中
完了
