

長野電鉄屋代線跡地整備事業

第三回検討委員会

令和4年8月23日

千曲市建設部都市計画課

○	これまでの経緯	・ ・ ・ ・ ・	2
○	現況図	・ ・ ・ ・ ・	3
○	検討体制	・ ・ ・ ・ ・	4
○	今までの取組	・ ・ ・ ・ ・	5
○	事業の概要	・ ・ ・ ・ ・	6
○	令和4年度事業計画	・ ・ ・ ・ ・	7
○	完成イメージ図	・ ・ ・ ・ ・	8, 9
○	今後の予定	・ ・ ・ ・ ・	10, 11

これまでの経緯

年 月	内 容	備考
平成23年11月	長野電鉄株式会社から千曲市へ屋代線廃止後の跡地の一括無償譲渡の申し入れ	
平成24年3月	長野電鉄屋代線 営業終了	
平成24年4月	同 廃線	
平成24年12月	長野電鉄屋代線跡地活用基本構想 策定	長野市 須坂市合同
平成25年12月	長野電鉄株式会社から千曲市へ一括無償譲渡	長野市 須坂市合同
令和2年3月	千曲市自転車活用推進計画 策定	
令和3年4月	交付金事業として事業化	第1期より

長野電鉄屋代線跡地整備検討会議

長野電鉄屋代線跡地整備事業(自転車歩行者道整備)に関する団体及び機関により構成する組織で、当該事業に係る連絡調整(協議、情報共有、連携、合意形成)を行うことを目的とする。

地元区

- 屋代第2区
- 屋代第4区
- 屋代第5区

小中学校

- 屋代小学校
- 屋代中学校
- 屋高附属中学校

しなの鉄道(株)

- 技術センター

長野県警察

- 千曲警察署

長野県

- 千曲建設事務所

千曲市

- 建設部

検討部会

長野電鉄屋代線跡地整備事業(自転車歩行者道整備)に係る意見聴取等を行うことを目的とする。

地元区

- 屋代第2区
- 屋代第4区
- 屋代第5区

小中学校

- 屋代小学校
- 屋代中学校
- 屋高附属中学校

自転車愛好家

- 市内の愛好家


千曲市

- 都市計画課

今までの取組（令和3年度）

年 月	内 容	備考
7月15日	第一回長野電鉄屋代線跡地整備検討部会	
9月2、3日外	沿線地権者との事業用地の境界立会い	
10月19日	道路設計地元説明会（屋代第4区）	
10月20日	道路設計地元説明会（屋代第5区）	
11月19日	第二回長野電鉄屋代線跡地整備検討部会	
12月14日	第一回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議	
令和4年1月5日	長野県公安委員会意見聴取（回答）	
令和4年3月25日	第二回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議	

市道4273号線
(屋代中学校北線)

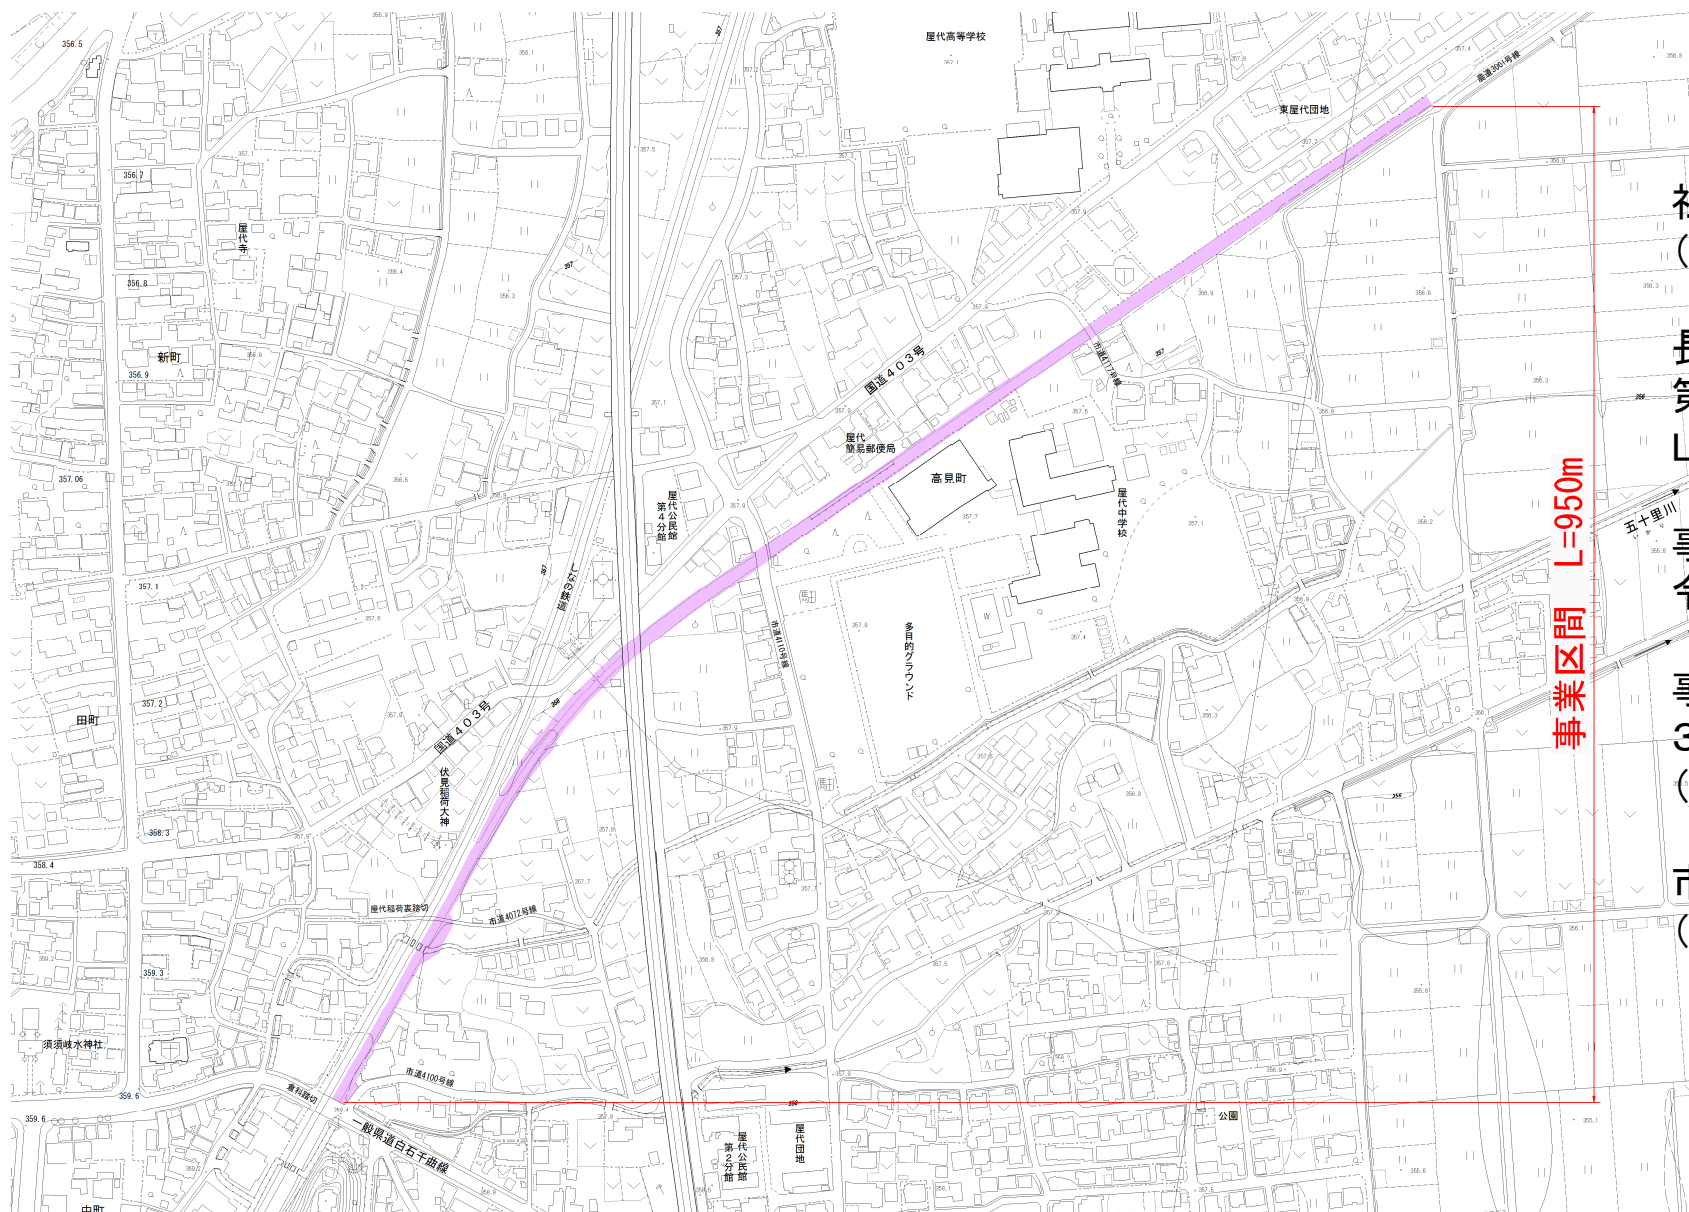

令和4年度事業計画

R4年度工事予定 L=515m


令和4年度工事予定


社会資本整備総合交付金事業
(防災・安全交付金)

長野電鉄屋代線跡地整備工事
L=515m W=6.0m

事業費
78,000千円

市道4273号線
(屋代中学校北線)

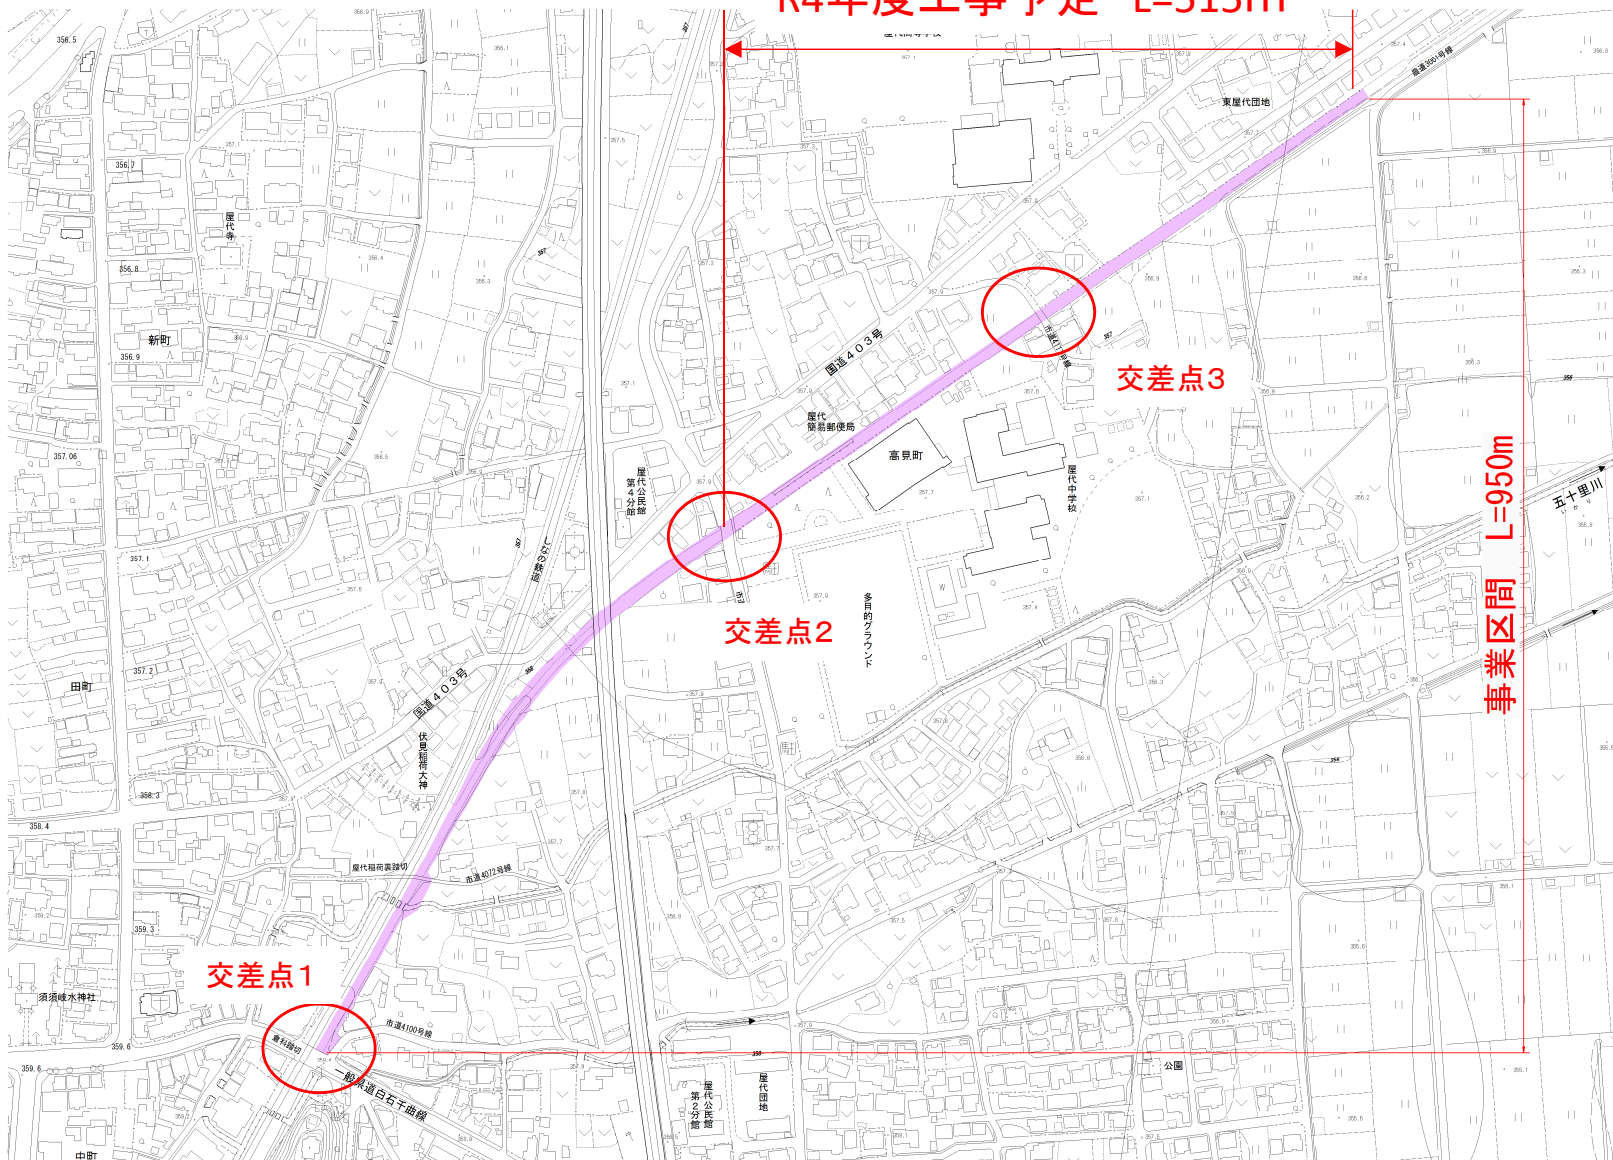

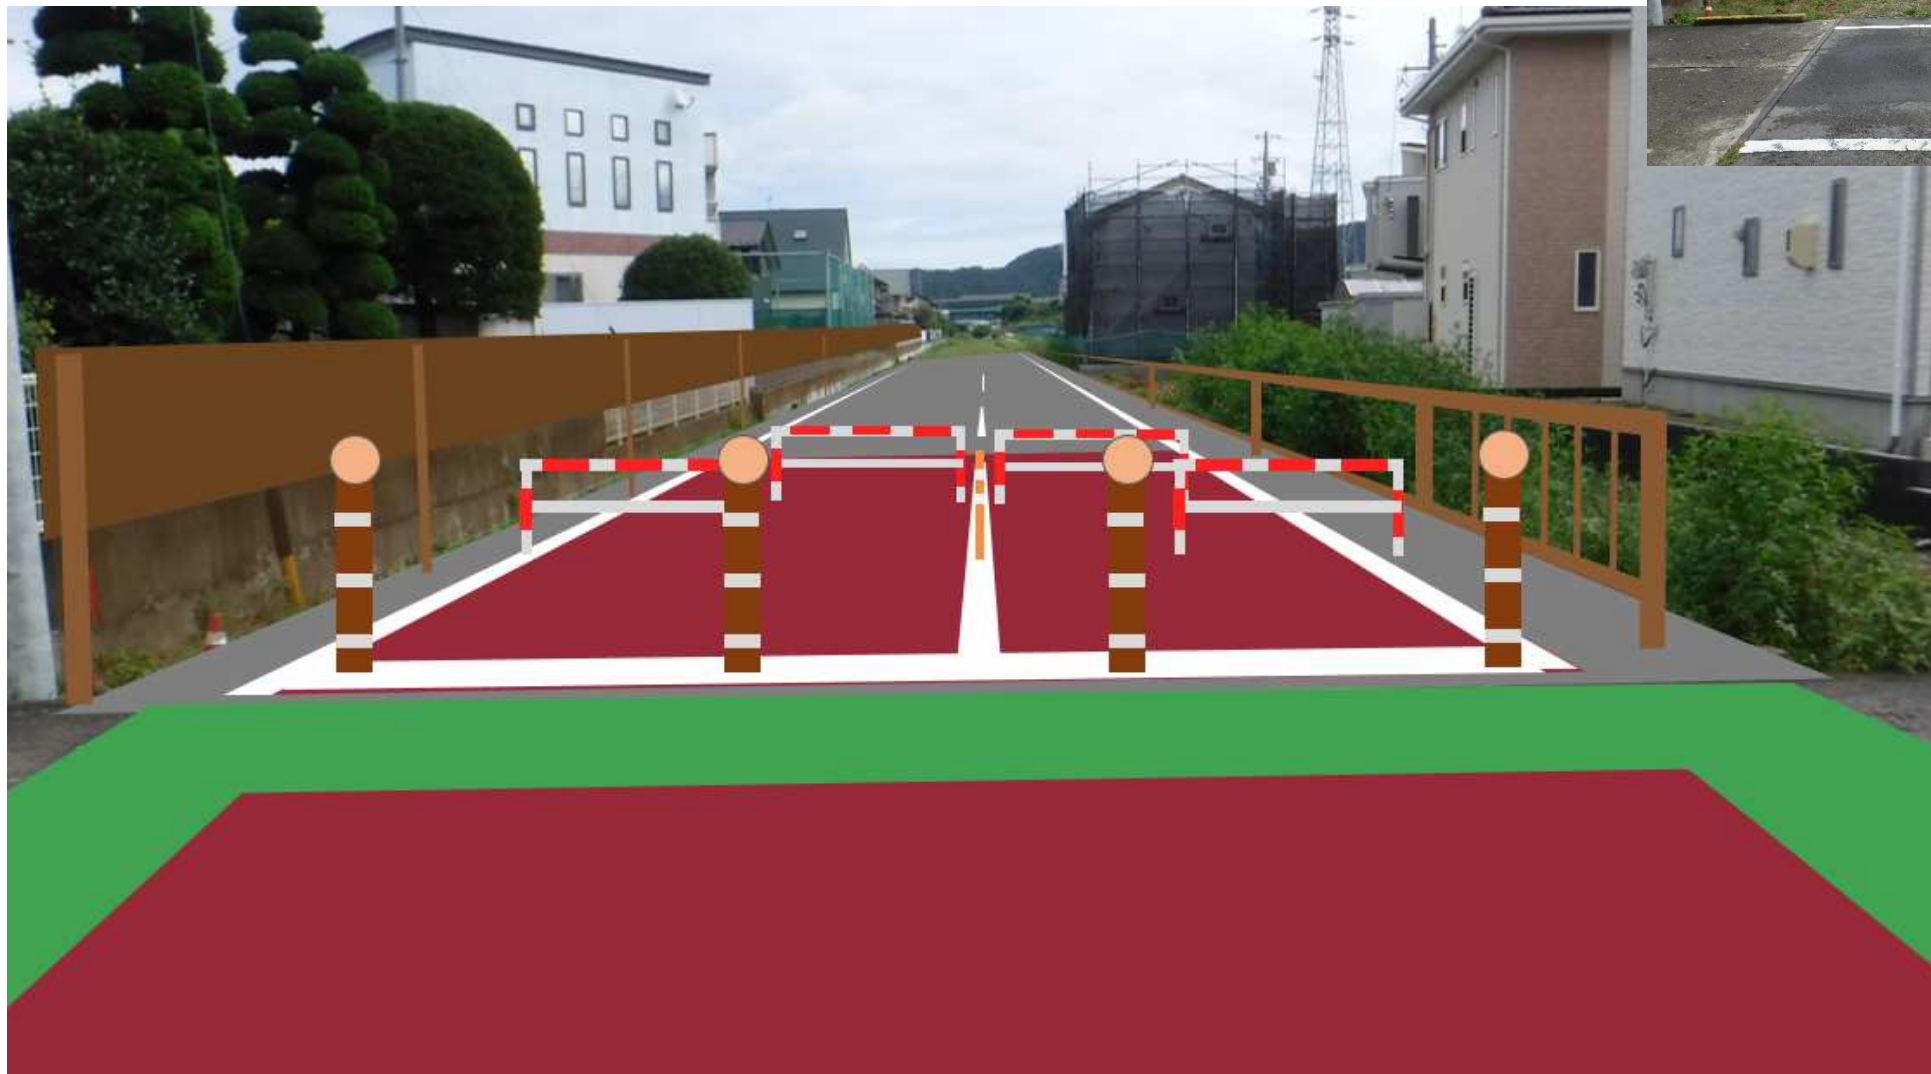

現況写真

交差点3の合成写真



Pattern-1 フリーゾーン 2 屋代 4 区区間 -1

フリーゾーンのインターロッキングブロックの合成写真



現況写真



グランデペイブ TOYO ワンユニオンシステムタイプ



ウォームグレ



アスベージュ

size
300 x 300 x 60(80)

ランダム比率 ウォームグレ：アスベージュ=1：1

○令和4年度

- 第三回検討部会開催 令和4年7月28日
- 第三回長野電鉄屋代線跡地整備検討会議 令和4年8月23日
- 令和4年度工事 令和4年8月予定
~ 令和5年3月まで
- 屋代地区全体、区長説明会開催 令和4年9月16日予定
- 地元工事説明会開催 令和4年9月下旬
- 関係地区回覧文配布 令和4年9月下旬

○令和5年度

- 令和5年度工事 令和5年5月予定

今後の予定

	令和 4 年						令和 5 年													
	7	8	9			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R4工事		契約				工事														
R5工事												契約		工事						
R4工事区間供用開始																				
検討部会																				
検討会議																				
屋代区 区長説明会																				
地元説明会																				
工事回覧配布																				
